

## 1. Откройте созданный проект одним из трех способов:

Способ 1. Дважды нажать левой кнопкой мыши.


Способ 2. Нажмите кнопку «Открыть».

Способ 3. Нажмите на версию.


## 2. После создания проекта необходимо заполнить график для него.

### 3. Добавьте на график первую работу.

Шаг 1. Нажмите кнопку «+ Добавить».



Шаг 2. Выберите из списка добавление работы.

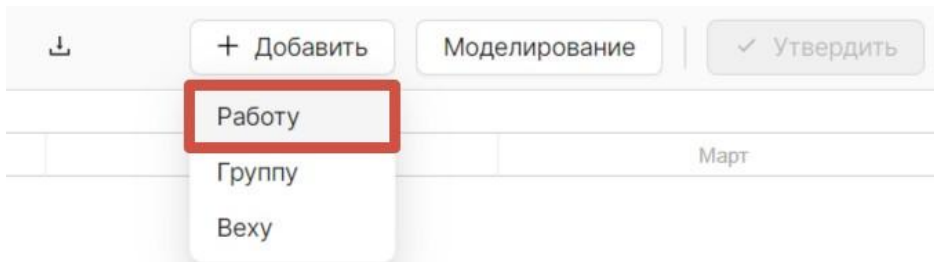

Шаг 3. Заполните название работы.


Шаг 4. Перейдите на вкладку «Сроки». Выберите приоритет длительности и заполните длительность для него:



Шаг 5. Выберите дату начала работы:



Шаг 6. Выберите способ планирования даты начала из выпадающего списка. По умолчанию дата начала будет «Начать как можно раньше»:



Шаг 7. Выберите дату окончания работы:



Шаг 8. Выберите способ планирования даты окончания из выпадающего списка. По умолчанию дата окончания будет «Начать как можно позже»:

Дата окончания: 08.02.2024

Связи к окончанию: Выберите источник связи

Начать как можно позже

- Начать как можно раньше
- Начать как можно позже
- Дата задана вручную

Шаг 9. Перейдите на вкладку «Показатели», выберите показатель и заполните значение объема для него. Остальные поля в форме можно оставить по умолчанию либо изменить.

Расчёт

Объем\*

0

Шаг 10. Нажмите кнопку «Добавить»:

Добавление показателя

Отмена

Добавить

Шаг 11. После заполнения показателей нажмите на кнопку «Выбрать основные».

Результаты

Выбрать основные

Готовность 0 + >

Объем работы 0 + >

Шаг 12. Около каждого показателя появится чекбокс, в котором можно поставить галочку. Выберите основной результат работы:

Результаты

Скрыть

Готовность 0 + >

Объем работы 0 + >

Шаг 13. Создаем еще одну такую работу.

Шаг 14. Необходимо связать между собой две созданные на графике работы.

Создадим связь к дате начала выбранной работы. Для этого необходимо зайти в редактор работы на вкладку «Сроки». Выберите источник связи из выпадающего списка и нажмите на кнопку «+ Добавить»:

Дата начала: 23.01.2024

Начать как можно раньше

Связи к началу: Выберите источник связи

+ Добавить

- Работа 1
- Работа 2

Дата начала

Связи к началу

Шаг 15. Отметьте, откуда будет проведена связь. Возможные варианты:

- «От начала» — будет проведена связь от начала выбранного источника связи к началу создаваемой работы;
- «От завершения» — будет проведена связь от завершения выбранного источника связи к началу создаваемой работы.

Связь от "Работа 1"

Дата события	Смещение	КД	Целевая дата
10.01.2024	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="КД"/> <input type="button" value="v"/>	10.01.2024


Шаг 16. Установите способ применения связи. Возможные варианты:

- «Не ранее» — дата границы периода строки графика не должна быть меньше, чем целевая дата связи;
- «Не позднее» — дата границы периода строки графика не должна превышать целевую дату связи.


Связь от "Работа 1"

Дата события	Смещение	КД	Целевая дата
10.01.2024	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="КД"/> <input type="button" value="v"/>	10.01.2024

Шаг 17. Вы можете установить смещение — количество дней, на которое хотите сдвинуть целевую дату от даты события — в календарных или рабочих днях:

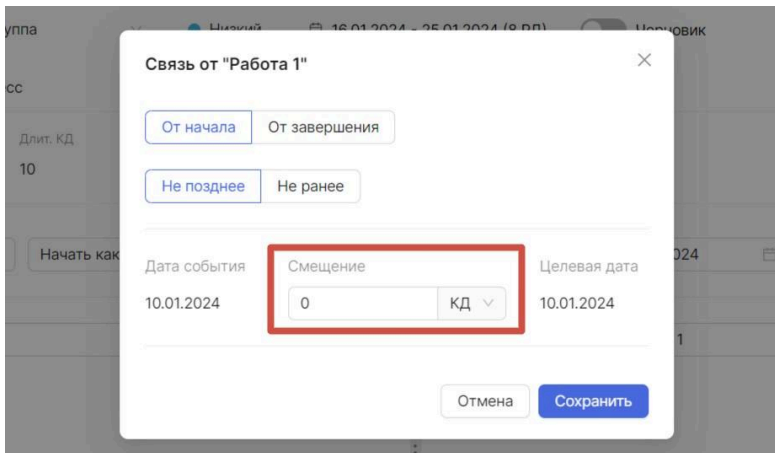


Шаг 18. После добавления всей необходимой информации о связи в модальном окне нажмите на кнопку «Сохранить»:

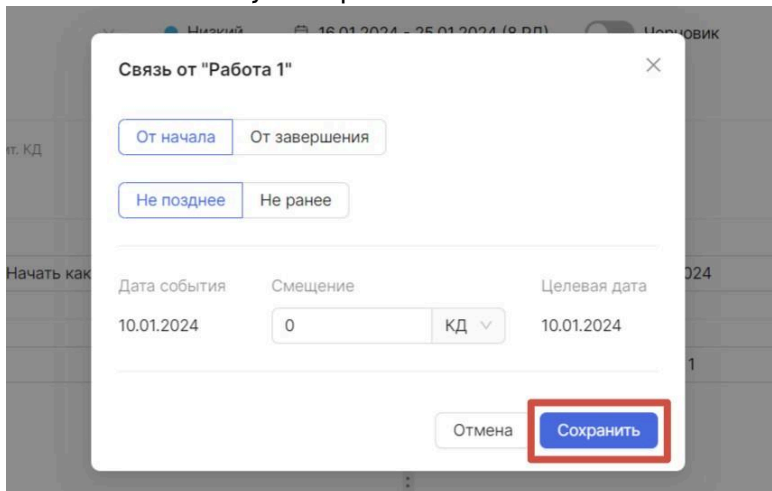


**Вы можете создать сколько угодно работ и связей между ними. А также группировать их с помощью создания групп.**

Шаг 19. Вы можете создать на графике вежу — ключевой момент в ходе выполнения проекта. Аналогично добавлению работы или группы добавьте вежу на график:



Шаг 20. Заполните название вехи.

Шаг 21. На вкладке «Сроки» для вехи заполните дату, укажите для нее дедлайн и настройте связи. Если дедлайн не будет указан, система будет считать дедлайном дату вехи.



Шаг 22. После заполнения информации о вехе сохраните ее.
